工 事 実 施 工 程 表

自　令和 4　年 〇 月
至　令和 4　年 〇　下旬

令和 4年 〇月 〇日現在
会社名　五月女建設株式会社

工事名　**栃木県宇都宮市　木造二階建住宅曳家工事**

工　種	種　別	細　別	単位	数　量	構成率	進捗率
支障物撤去	庭木伐採他		式	1.0	4%	計画0% 実施0%
整地（宇都宮市役所）						
準備校・仮設工	Coはつり他		式	1.0	8%	計画0% 実施0%
掘削・揚家工			式	1.0	32%	計画0% 実施0%
曳家工・下家工			式	1.0	18%	計画0% 実施0%
後処理工	埋戻し他		式	1.0	8%	計画0% 実施0%
外構工事	擁壁・駐車場		式	1.0	26%	計画0% 実施0%
後片付け			式	1.0	4%	計画0% 実施0%
				合計	100%	計画0% 実施0%

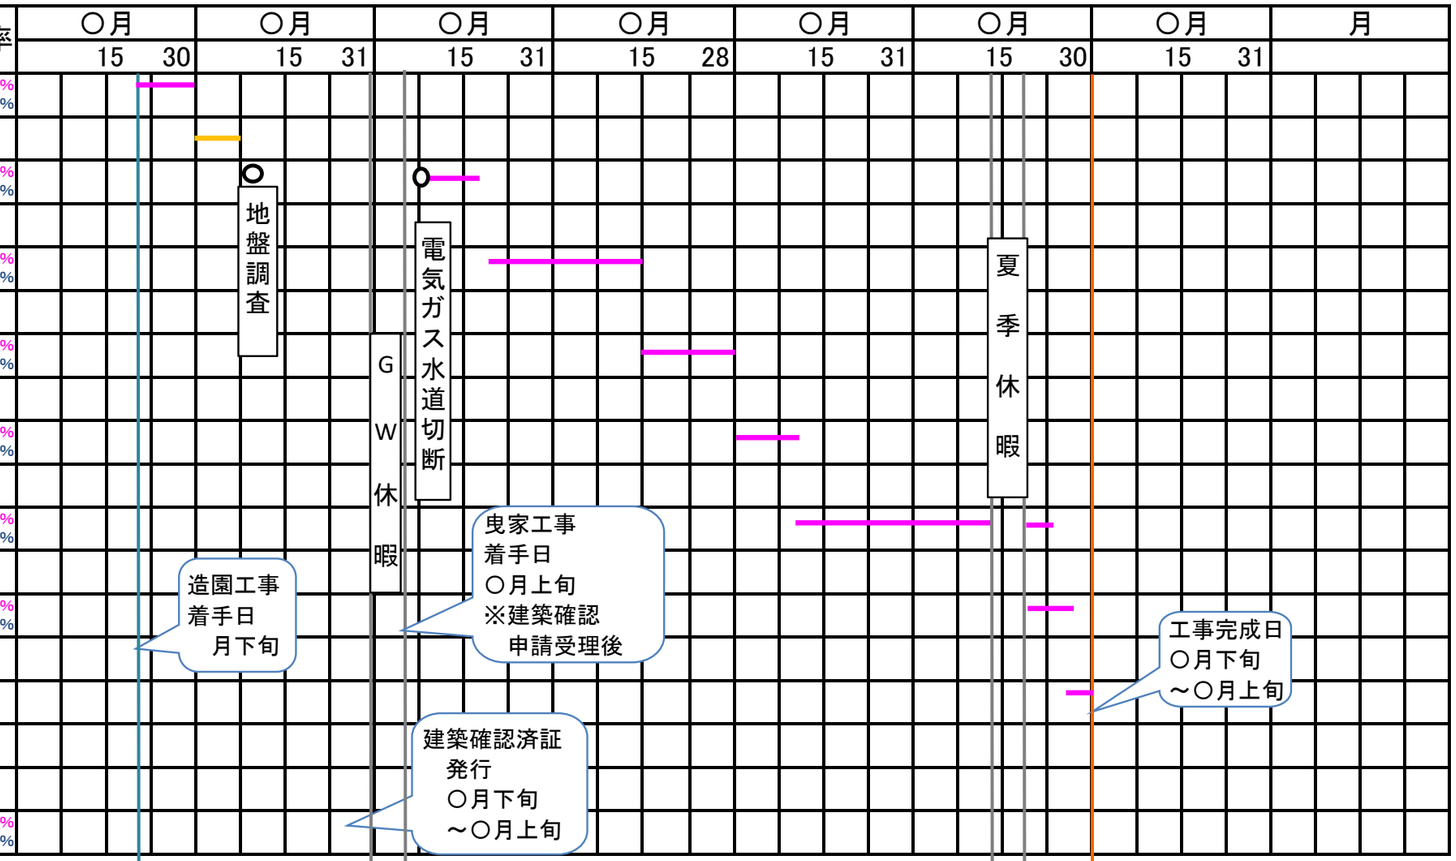

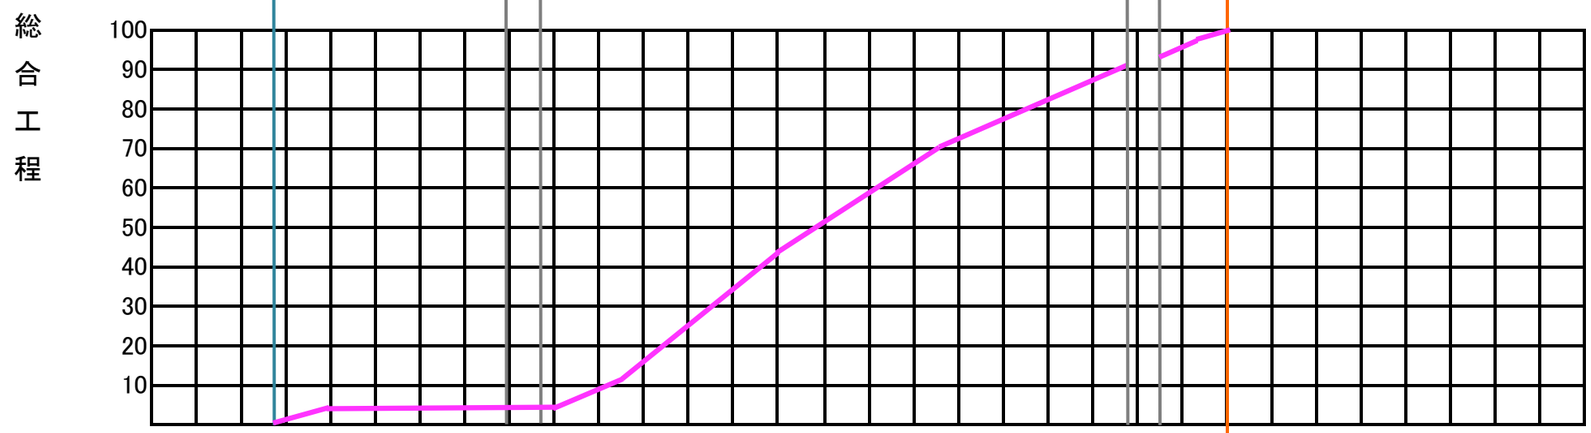

計画工程

実施工程

（　　）変更

注記：
※建築確認申請受理の遅延や天候不順により、
工程が遅れることがあります。ご了承下さい。

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	月
計画	0.0	4.0	25.0	58.0	82.0	100.0		
変更後								
実施								
変更後								
