工 事 実 施 工 程 表

自　令和4(2022)　年　○　月　　旬

至　令和4(2022)　年　○　月　○　日

令和4(2022)年　○月　○日現在

会社名　五月女建設株式会社

工事名　**栃木県栃木市　木造二階建住宅　曳家工事**

工　種	種　別	細　別	単位	数　量	構成率	進捗率
準備校・仮設工			式	1.0	4%	計画0% 実施0%
はつり・H鋼組立	Coはつり他		式	1.0	15%	計画0% 実施0%
揚家工・曳家工	東側仮置き		式	1.0	15%	計画0% 実施0%
基礎工事			式	1.0	20%	計画0% 実施0%
曳家工・下家工			式	1.0	18%	計画0% 実施0%
後処理工・改修	埋戻し・キッチン改修 設備工事他		式	1.0	18%	計画0% 実施0%
外構工事			式	1.0	6%	計画0% 実施0%
後片付け			式	1.0	4%	計画0% 実施0%
				合計	100%	計画0% 実施0%

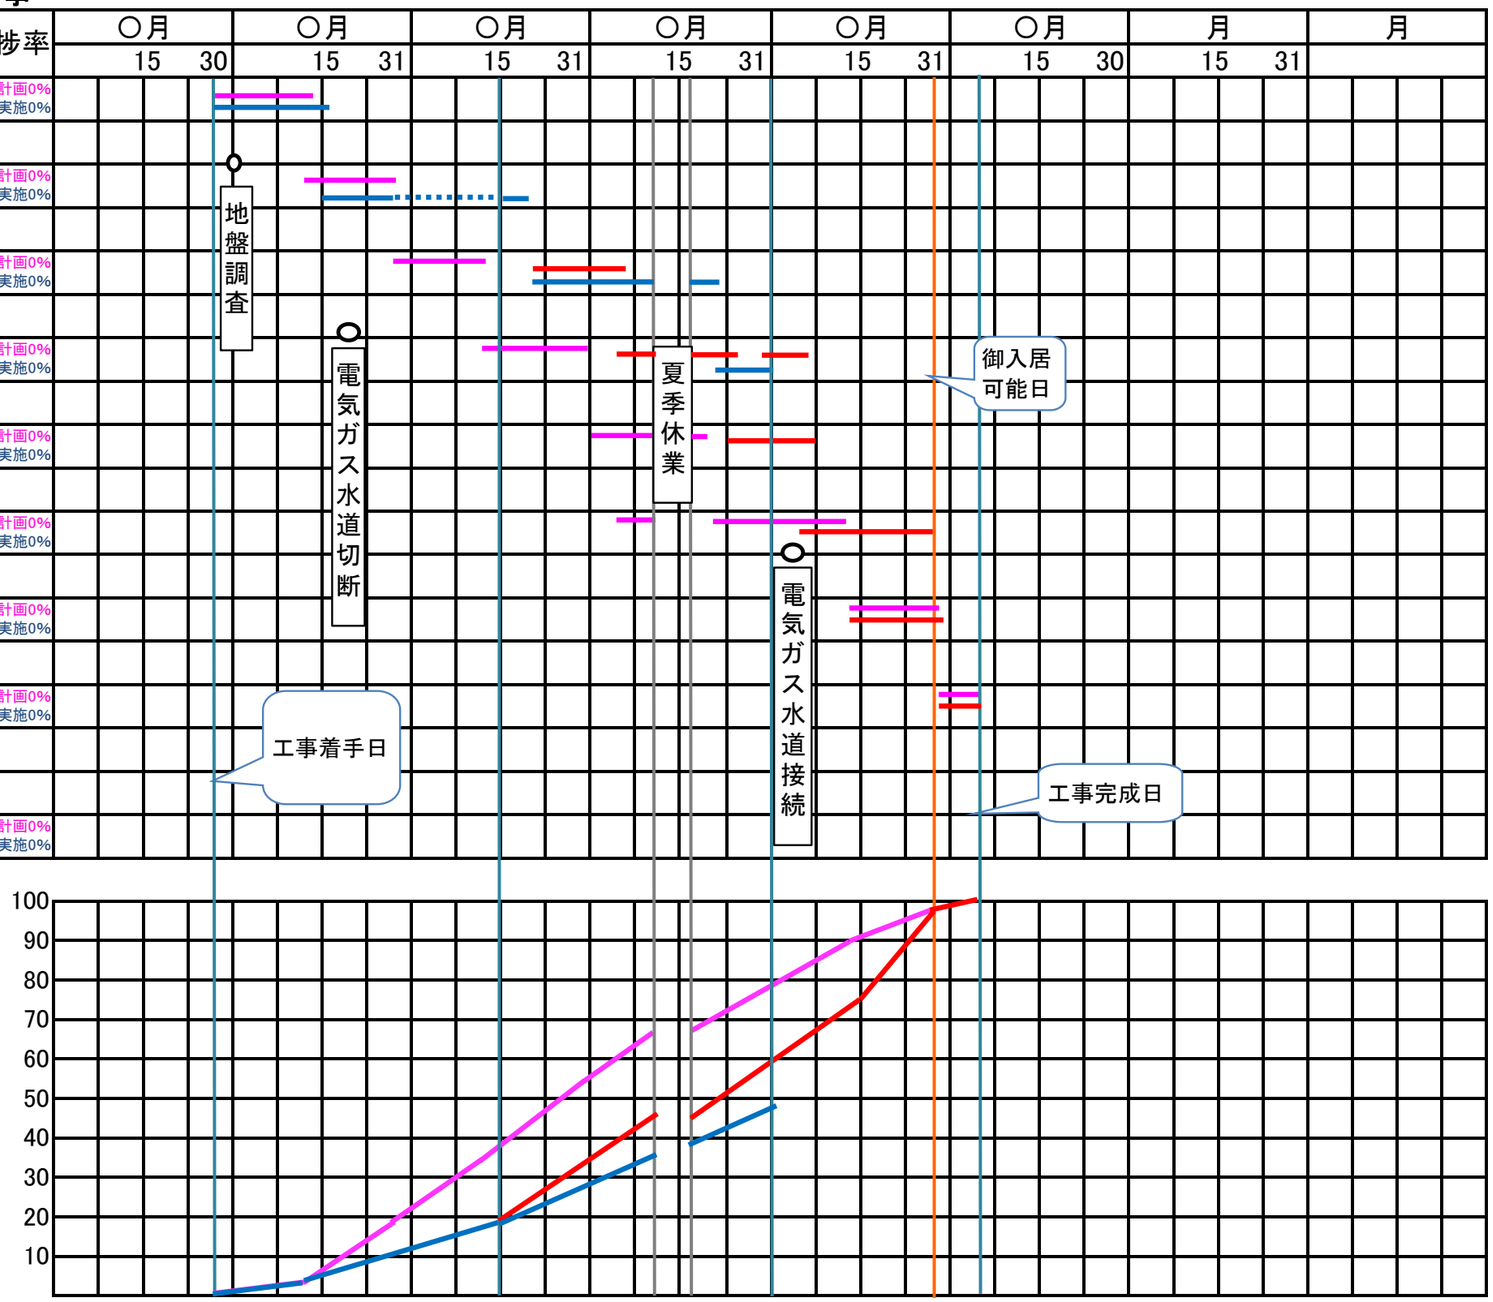

計画工程

実施工程

（　　）変更

確認事項

※この工程表には休暇による工事延長は含まれておりません

※建築確認証の交付の遅れ、東京電力・NTT等の引込線延長工事、天候不順等により工程が遅れることがあります。

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	月	月
計画	0　3.0	24.0	56.0	78.0	98.0	100.0		
変更後			18.0　27.0	58.0	98.0	100.0		
実施	0　3.0	13.0	18.0	44.0				
変更後								
